



Belastingdienst

Voortgang op en status van HVB-prioriteiten

25 maart 2021

0



Belastingdienst

▲ Afgerond

▲ Oplaveren stukken

▲ Stuurgroep

▲ Kamerbrief


▲ Politiek besluit

▲ Deadline toezegging

----- Besluitkosten

▲ Vertraging

Overzicht | Kritiek pad voor HVB prioriteiten

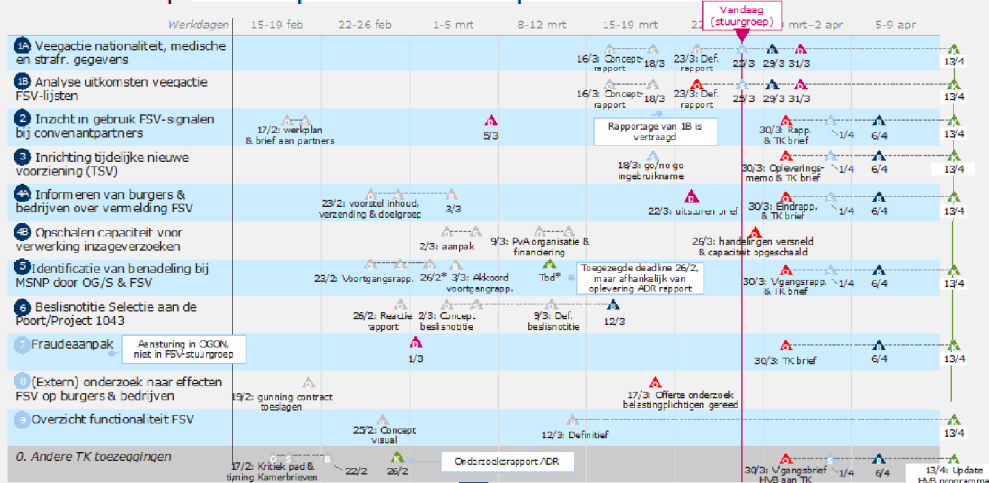



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (I/III)

1A Veegactie nationaliteit, medische en straf. Gegevens	- Toetsing van 953 applicaties op rechtmatigheid van gebruik van i) het persoonsgegeven nationaliteit en ii) medische en strafrechtelijke gegevens is afgerond. Onduidelijkheden en/of inconsistenties t.b.v. de rapportage zijn verhelderd in samenwerking met verantwoordelijk directeuren en aanspreekpunten. De steekproef onder gebruikers van applicaties voor additionele kwaliteitscontrole is afgerond. De uitkomst is verwerkt in de opgeleverde resultaten - Rapportage is opgesteld door projectteam a.h.v. definitieve resultaten van het onderzoek. - Status geel: De rapportage dient nog verder beoordeeld en aangescherpt te worden; de verantwoordelijken werken eraan deze op tijd op te leveren om bevindingen en conclusies op te kunnen nemen in de kamerbrief van 13/04
1B Analyse uitkomsten veegactie lijsten met risicosignalen	- Analyse van de in de veegactie opgehaalde lijsten met risicosignalen is door directies aangeleverd. Status rood om dat onduidelijkheden en/of inconsistenties nog verklaard moeten worden door enkele directies. - Interventie is dat onduidelijkheden in projectteam en met directies zo spoedig mogelijk worden opgehelderd. De voortgang wordt dagelijks gemonitord en de stuurgroep behandelt dit onderwerp volgende week opnieuw. - Conceptrapportage is grotendeels opgeleverd door projectteam en wordt aangescherpt in week 13 o.b.v. input van directies. Uiteindelijke formulering wordt daarna aangescherpt.
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	- AVG-specialist van MKB heeft een nieuwe toets uitgevoerd op de privacygrondslag voor gegevensuitwisseling met DF&A tbv matching - In het technisch overleg met LSI op 18-03 is een herziene onderzoeksaanpak overeengekomen nadat LSI tegen het probleem aanliep dat data uit het peljaar 2019 niet meer beschikbaar was. LSI gaat nu onderzoek doen naar nog openstaande projecten uit peljaar 2019 - Een voortgangsrapportage en concept passage voor TK-brief wordt opgesteld. Deze wordt ter afstemming voorgelegd aan de convenantpartners op 31 maart

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (II/III)

3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	- De bouwfase is op 18-03 afgerond, het testen van de applicatie wordt gecontinueerd - Een tweetal pressure-cookers sessies hebben plaatsgevonden waarin afgevaardigden van P, MKB, GO, Keten GKT en IV&D hebben vastgesteld welke vragen beantwoord moeten worden in de GEB om deze goed te keuren. In het overleg zijn geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de bezwaren technische implicaties zouden hebben en aanpassingen aan de bouw vragen. De GEB en mogelijk de werkinstructies dienen wel te worden aangepast. Doel is om uiterlijk 29/3 een nieuwe versie van de GEB aan IV&D voor te leggen. - Status geel: Indien de nieuwe versie van de GEB niet als voldoende beoordeeld wordt, kan Go / No Go beslissing niet genomen worden in Stuurgroep van 1/4 en kan ingebruikname TSV niet gemeld worden in TK-brief van 13/4. - Interventie: Afstemming op de benodigde additionele informatie in de GEB met IV&D.
4. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	- Definitief besluit over verspreide verzending is genomen (2.000 brieven in tranche 1 eind maart). Het definitieve adresbestand voor tranche 1 en de brief zijn tijdig aangeleverd bij CAP voor een matdatum van 31 maart. Het gaat om 2.000 blauwe brieven. - Toeslagen heeft aangegeven dat de identificatie van burgers voor rode brieven o.b.v. de huidige dataquery's niet wordt herkend. Nadere afstemming over de query's vindt deze week plaats.
4b. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	- Eerste intakegesprekken zijn gevoerd met de in te huren medewerkers. Verwacht wordt dat deze medewerkers vanaf 6/4 actief kunnen zijn (incl. werkplek en laptop). Daarnaast is het programmateam gevormd en is de programmacadans gestart op 23/3. - De formele opdrachten voor het bouwen van een webform en workflowsysteem zijn gegeven en Product owners voor de desbetreffende systemen zijn aangesteld. De eerste testversie van het webform staat inmiddels live. Er is daarnaast een eerste demo ontwikkeld voor het workflowsysteem om ook deze te kunnen testen. - Status rood: Ondanks de gezette stappen op het gebied van organisatie en IV blijft het risico op geen tijdige oplevering van webform en workflow vóór 31 maart groot vanwege de zeer korte doorlooptijd. - Ter interventie worden de functionaliteitseisen voor de eerste oplevering op een minimumniveau ('MVP') gesteld.

Status | ● Oplevering volgens plan ● Risico's voor tijdige oplevering ● Interventie nodig voor tijdige levering



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (III/III)

5. Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

- Er zijn 60 medewerkers ingezet om beschikkingen te bekijken. Handmatige selectie is gestart op 19/03 om te bepalen of een beschikking een afwijzing MSNP betreft.
- Op 29/03 start de inhoudelijke beoordelingen van beschikkingen die een afwijzing MSNP betreffen, mits de inrichting van de werkomgeving afgerond is. Om dit af te ronden moeten de exacte criteria voor toetsing worden afgestemd. Deze worden eind deze week vastgesteld.
- Het plan van aanpak is aangepast aan het rapport van de ADR. **Status rood** omdat het niet zeker is hoe lang de beoordeling van elke beschikking duurt, onder meer omdat nieuwe bevindingen de lijst met toetsingscriteria nog kunnen veranderen. Daarom kan nog niet met zekerheid worden gezegd dat de 400k actie 21/05 is afgerond.
Interventie: Benodigde capaciteit bovenop de reeds geworven wordt komende week in kaart gebracht. Maatregelen worden getroffen om deze beschikbaar te maken.

6. Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043

- De beslisnotitie is aangepast in overleg met het kerndepartement en ter besluit ingediend bij de Stas (23/3). De Stas heeft feedback gegeven op deze notitie; deze zal worden verwerkt, waarna de notitie opnieuw ingediend kan worden.

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Ter informatie | Plan voor oplevering beslisnotities

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Alkkoord op kritiekpad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Alkkoord op voortgangsrapportage en begeleidend taksat voor TK (samen met ADR rapport) naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV	1/3	Ja (afhankelijk van ADR rapport)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Alkkoord op voorstellen t.a.v. over doelgroep ('getijden', EGS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen)	17/3	Nee
6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043	Alkkoord op wel/niet weer in werking zetten proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel, o.b.v. uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.	23/3	Nee
1A. Veegactie nationaliteit, medische en strafv. gegevens	Alkkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidend taksat voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
1B. Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	Alkkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidend taksat voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Alkkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	6/4	Ja (13/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Alkkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidend taksat voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Alkkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidend taksat voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Alkkoord op tweede voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidend taksat voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
7. Fraudeaanpak	Alkkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidend TK brief	Exacte timing en inhoud ter besluit in OGON-overleg op 09/03	6/4 Ja (13/4)
Algemeen	Alkkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	6/4	Ja (13/4)



Belastingdienst
