



Belastingdienst

Voortgang op en status van HVB-prioriteiten

12 maart 2021

0



Belastingdienst

Afgelond

Opleveren
stukken

Stuurgroep

Kamerbrief


Politiek besluit

Deadline toezegging

Besluitkosten

Vertraging

Overzicht | Kritiek pad voor HVB prioriteiten

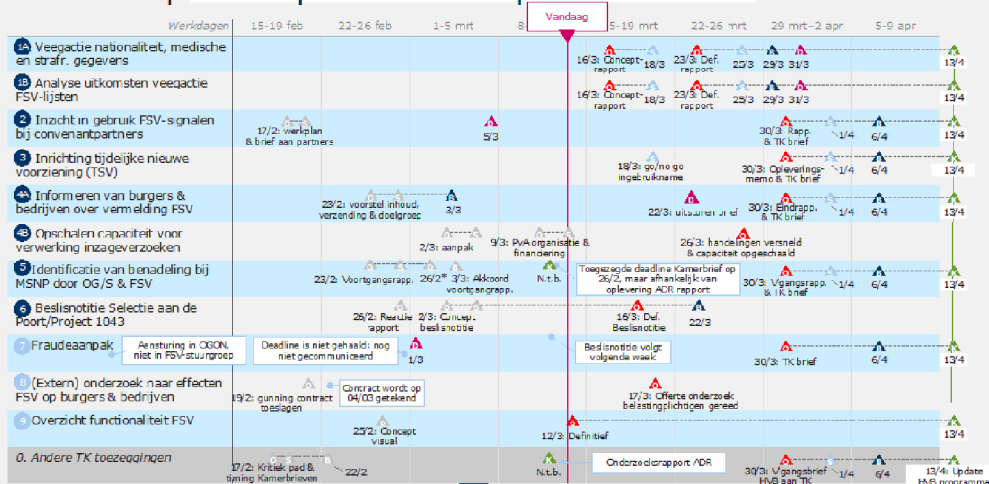



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (I/III)

1A Veegactie nationaliteit, medische en strafre. gegevens	Overzicht van applicaties in scope is gerooid (966 applicaties). Momenteel zijn voor 600 van de 966 applicaties de rechtsgronden vastgesteld, vrije tekstvelden geanalyseerd en mitigerende maatregelen uitgewerkt. De overige applicaties worden door de directies geanalyseerd vóór 15/03 - Het team levert op 16/03 de eerste inhoudelijke concept versie van de rapportage. Verwacht wordt dat na aanscherping de definitieve versie volgens plan kan worden opgeleverd op 23/03
1B Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	- Alle directies hebben concept input aangeleverd. Deze input is op woensdag 10/03 door het kernteam beoordeeld op kwaliteit; eventuele feedback is teruggekoppeld aan de directies - De directies leveren op 12/03 de definitieve versie van hun input aan. De terugkoppeling van het kernteam op de concept input moet er voor zorgen dat de kwaliteit van de definitieve input afdoende is voor een gedegen analyse - Het team levert op 16/03 de eerste inhoudelijke conceptversie van de rapportage
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	- Een bestuurlijk afstemmingsoverleg met de convenantpartners heeft plaatsgevonden op 05/03. Alle partners zijn akkoord met de voorgestelde opzet, mits voorgegaan aan onderlinge detedeling een AVG-technisch overleg uitsluitse kan geven over de grondslag voor deling - Indien dit AVG-overleg geen geldige grondslag vaststelt, moeten de onderzoeksopzet en tijdslijn ingrijpend worden aangepast. Het AVG-overleg met RIEC-Noord (Regionale Informatie en Expertise Centra, de convenantpartner waarmee eerste pilot wordt gestart) is gepland voor eind maart; dit overleg dient intern voorbereid te worden
3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	- De bouwfase loopt; er hebben zich de afgelopen periode geen aanvullende issues op de bouw voorgedaan. Op 18/3 moet de bouwfase zijn afgerond, om op 1 april TSV op te leveren. Er vindt dagelijks monitoring plaats om mogelijke risico's op vertraging meteen te kunnen mitigeren - Op 09/03 is gestart met de Gebruikers Acceptatie Testen (GAT); deze verlopen tot nu toe goed. Daarnaast is gestart met de benodigde stappen voor inproductiename - De GEB wordt eind deze week ingediend bij IV&D ter beoordeling. Afhankelijk van deze beoordeling bestaat een risico op vertraging, zeker als aanpassingen benodigd zijn in het systeem zelf. Dit risico wordt gemitigeerd door het nauw betrekken van IV&D collega's in de TSV-stuurgroep. Afspraak is gemaakt dat bij eventuele aanpassingen in het systeem het besluit wordt geëscaleerd naar de HVD-stuurgroep

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdsige oplevering



Interventie nodig voor tijdsige levering



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (II/III)

4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV

- Voor het vaststellen van de populatie voor het versturen van de brief is een WMK-toets uitgevoerd, deze is ter verificatie aangeboden aan team CAP/JAG via het gegevensloket
- De tekst van de brief is afgerond met de schrijversgroep. Daarnaast is een beslissinginitiatie voorbereid. Deze brieftekst & beslissinginitiatie worden zo spoedig mogelijk aan de staatssecretaris voorgelegd. Omdat er ~1,5 week nodig is voor het actualiseren van het adressenbestand, het printen en het verzenden is voor 1&3/23 een besluitvorming nodig om de matdatum van eind maart te halen

4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken

- Er is een voorstel gemaakt voor de inrichting en aansturing van de organisatie voor het afhandelen van inzageverzoeken. De stuurgroep heeft dit voorstel geaccordeerd. De procesflow wordt op dit moment verder gedetailleerd en geïmplementeerd. Belangrijkste knelpunten per processtap o.a. ten aanzien van capaciteit zijn geïdentificeerd en besproken met betreffende directies. Capaciteitsvraag wordt in week 11 definitief vastgesteld
- Financiering voor deze organisatie wordt voorlopig georganiseerd via de staande organisatie; in samenspraak met C&F zal dit verder worden ingericht binnen het programma
- Eerste leden van centraal projectteam zijn aangewezen vanuit de dienstonderdelen. De resterende capaciteit dient deze week te worden aangevuld. **Interventie:** Directeuren hebben tijdens de stuurgroep aangegeven gevraagde capaciteit vanaf 15-03 beschikbaar te stellen
- Expertteam van behandelaren en procesanalist is gestart met het identificeren van opties voor versnelling. Een eerste versnellingsmaatregel (het vooraf categoriseren van persoonsgegevens) wordt op 12/3 opgeleverd

5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

- ADR rapport en TK brief inclusief een passage voortgangsrapportage MSNP wordt verstuurd naar de Tweede Kamer op een nader te bepalen datum afhankelijk van publicatie ADR
- Naar aanleiding van het concept rapport ADR waarin gesproken wordt over toepassing van grensbedragen los van FSV registratie en/of O/GS is een beheersmaatregel genomen. Deze beheersmaatregel houdt in dat elke MSNP-afwijzing op blauwe schuld handmatig wordt getoetst
- De resultaten van het concept ADR-onderzoek hebben impact op de scope van het project: 1) verlengen van te onderzoeken periode van tot 1 maart 2020 naar maart 2021 en 2) toevoegen van afwijzingsgrond van onder- en bovengrens in de inhoudelijke beoordeling. **Interventie:** het Plan van Aanpak wordt deze week aangepast op deze scope-uitbreidingen
- Er is gestart met het verdichten van de 400.000 brieven. Verwacht wordt dat een lijst met personen waarvan niet zeker is dat zij een afwijzing MSNP hebben ontvangen door DF&A opgeleverd wordt op 12/03, zodat op 15/03 kan worden begonnen met de handmatige selectie en met inhoudelijke beoordeling.

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Voortgang, status en eventuele hulpvragen per prioriteit (III/III)

6 Beslissing Selectie aan de Poort/Project 1043

- De beslissing is deze week voorgelegd aan het kerndepartement en naar aanleiding van dit overleg aangepast. In de aangepaste versie wordt verduidelijkt en onderbouwd onder welke voorwaarden het gebruik van selectie aan de poort hervat kan worden. De aangepaste beslissing wordt in de loop van volgende week aan de staatssecretaris voorgelegd.

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Ter informatie | Plan voor oplevering beslisnotities

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Alkkoord op kritiekpad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Alkkoord op voortgangsrapportage en begeleidend tekst voor TK (samen met ADR rapport) naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OG/S of FSV	1/3	Ja (afhankelijk van ADR rapport)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Alkkoord op voorstellen t.a.v. over doelgroep ('getijsten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen)	T.b.d.	Nee
6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043	Alkkoord op wel/niet weer in werking zetten proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel, o.b.v. uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.	T.b.d.	Nee
1A. Veegactie nationaliteit, medische en strafv. gegevens	Alkkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidend tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
1B. Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	Alkkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidend tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Alkkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	6/4	Ja (13/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Alkkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidend tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Alkkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidend tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Alkkoord op tweede voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidend tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
7. Fraudeaanpak	Alkkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidend TK brief	6/4	Ja (13/4)
Algemeen	Alkkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	6/4	Ja (13/4)



Belastingdienst
