



Belastingdienst

Voortgang op en status van HVB-prioriteiten


25 februari 2021



Belastingdienst



Overzicht | Kritiek pad voor HVB prioriteiten

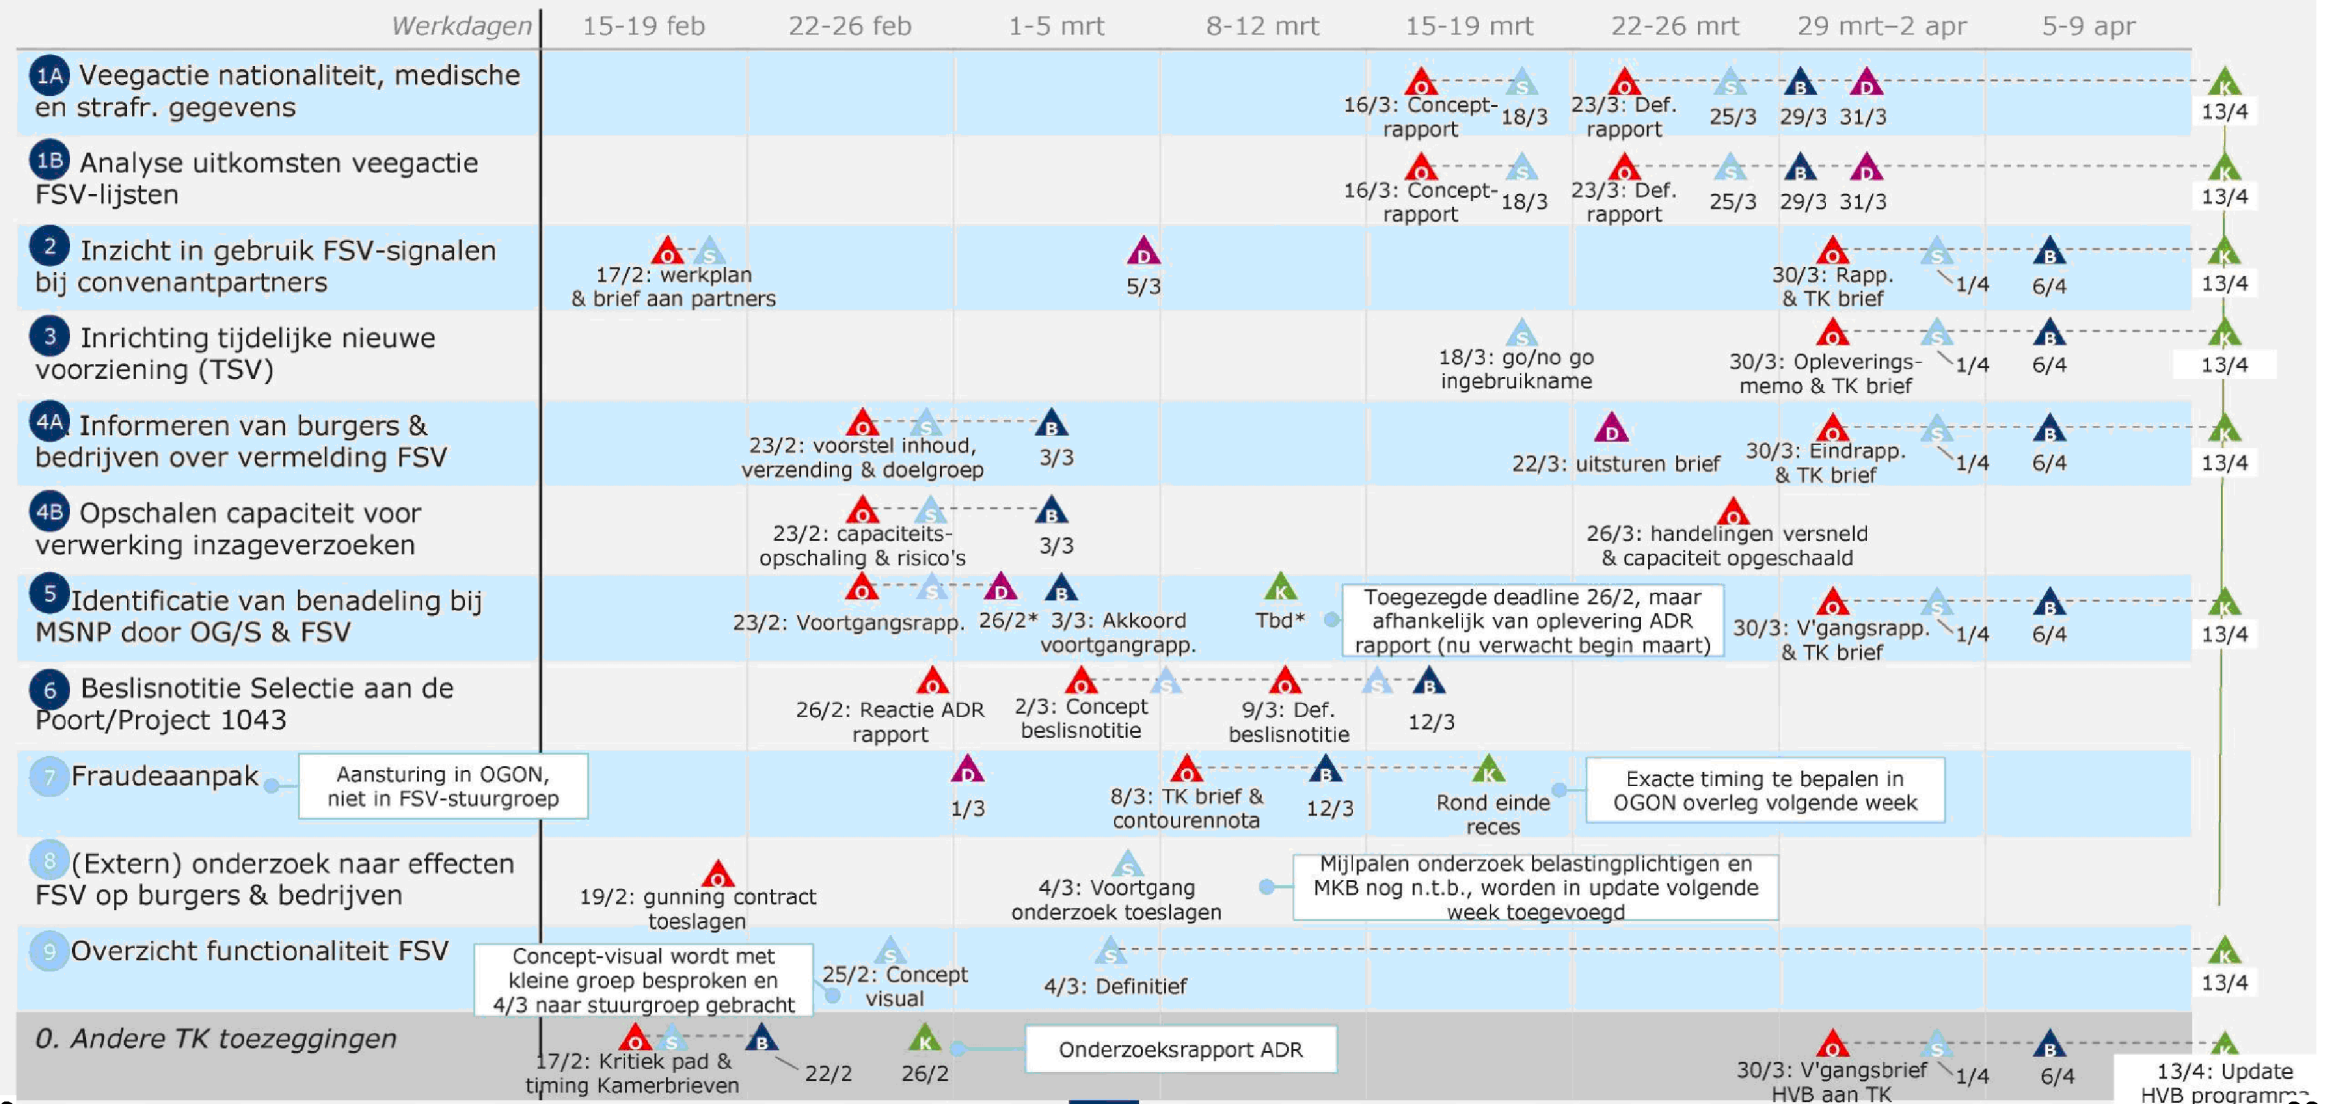

Voortgang en status per prioriteit (I/II)

1A Veegactie nationaliteit, medische en straf. gegevens		- Overzicht van applicaties in scope is verder aangevuld. Inventarisatie van ervaringen analyseren vrije tekstvelden is gestart zodat planning verder aangescherpt kan worden. Benodigde capaciteit bij query teams is aangevraagd en toegezegd - Om de volledigheid van de lijst met applicaties in scope te waarborgen, is de benodigde capaciteit van domeinarchitecten toegezegd en vrijgemaakt. Zij zullen hier samen met de aanspreekpunten in de verschillende domeinen (e.g., MKB & P) nogmaals een check op doen
1B Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten		- Om ervoor te zorgen dat op 5/3 alle input over de 211 bestanden is ontvangen, is een additionele voortgangscontrole ingericht en actieve kwaliteitscontrole op input opgestart - Daarnaast is op 1/3 een workshop gepland met alle aanspreekpunten om mogelijke issues & onduidelijkheden bij het aanleveren van input te bespreken en op te lossen
2 Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners		- Projectleider is aangesteld en werkplan incl. benodigde capaciteit zijn vastgesteld en vrijgemaakt. Brief naar convenantpartners is opgesteld en wordt verstuurd op 26/2 - Er is onduidelijkheid over wat de partners precies nodig hebben om data afkomstig uit FSV te herleiden. Afstemming met partners hierover (en over PvA & tijdslijnen) staat gepland voor 5/3
3 Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)		- Concept procesbeschrijvingen zijn opgesteld en deze week voorgelegd aan TSV stuurgroep voor akkoord - De bouwfase voor releaseversie 2 zou van start moeten zijn gegaan, maar de capaciteit van het bouwteam is deels nodig voor WTL (Wet Tegenmoetkomingen Loondomein) wegens de scherpe tijdslijnen van dit traject: vóór 15 maart moet een voorlopige WTL-berekening bij werkgevers liggen. Dit leidt tot een vertraging op de oplevering release 2 van TSV op 4/3 - De [] GKT en [] IV bezien hoe de opgelopen vertraging kan worden ingehaald en rapporteren hier volgende week in de stuurgroep over
4A Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV		- De toestemming tot benodigde databases is verkregen. Er is samen met gedragswetenschappers een conceptbrief opgesteld, om te waarborgen dat de brief duidelijk is zodat vervolgvragen (voor o.a. BelTel) beperkt blijven. Concept beslisnotie met voorstel t.a.v. inhoud, doelgroep en verzendingswijze brief wordt volgende week aan Stas voorgelegd - Acuutste risico op vertraging bestaat uit inhoudelijke samenloop met prioriteit 4B: onduidelijkheid rondom de uitvoerbaarheid van inzageverzoeken en het plan van aanpak hieromtrent zou 4A op kunnen houden

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering



Voortgang en status per prioriteit (II/II)

4B Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken

- Er zijn scenario's opgesteld om de operationele consequenties van de Motie Marijnissen in kaart te brengen. Deze scenario's zijn uitgewerkt op basis van eerdere ervaringen (e.g., bij Toeslagen). Dit heeft het inzicht gebracht dat er veel aandacht nodig is voor de uitvoerbaarheid van de motie, met name door de grote hoeveelheid inzageverzoeken die op de brief kunnen volgen. Dit punt is meegenomen in 4A, door i) in beslisnotitie voor te stellen de brief in tranches te versturen en ii) de brief op zo'n manier op te stellen dat verdere vragen (en daarmee inzageverzoeken) geminimaliseerd worden. Dit is gedaan in samenwerking met gedragswetenschappers
- Er wordt op dit moment gewerkt aan een plan van aanpak om de uitvoerbaarheid te waarborgen. Dit plan van aanpak wordt volgende week aan de stuurgroep voorgelegd

5 Identificatie van benadeling bij MSNP door OG/S & FSV

- Voortgangsrapportage is geschreven en ligt voor aan stuurgroep (25/2) en Stas (volgende week). Daarnaast is 60 fte aan extra capaciteit aangetrokken; instroom eerste groepen is gepland op 15/03 (Amsterdam) en 17-03 (Groningen)
- Belangrijkst aandachtspunt voor komende week is het verder aanscherpen van het plan van aanpak voor verdichting en analyse van 400.000 brieven. Daarnaast bestaat er een afhankelijkheid op DF&A voor het opleveren van de lijsten met personen die zeker een afwijzing hebben ontvangen voor MSNP. Deze lijsten moeten binnen zijn om analyse te starten

6 Beslisnotitie Selectie aan de Poort/Project 1043

- ADR concept tekstblokken ontvangen en uitgezet voor hoor/wederhoor. Vernieuwde generieke werkwijze en werkinstructies zijn vastgesteld door [] P, CAP en DF&A
- Uitdaging in aankomende weken is snel komen tot afgestemde notitie n.a.v. definitieve ADR rapport voor uiterlijke voorlegging aan Stas op 12/3. UHB gaat vanaf 25/2 ondersteunen om voortgang te versnellen

Status |



Oplevering volgens plan



Risico's voor tijdige oplevering



Interventie nodig voor tijdige levering

Ter informatie | Plan voor oplevering beslisnotities

HVB prioriteit	Besluit	Datum	Onderdeel van Kamerbrief?
Algemeen	Akkoord op kritiek pad voor HVB-prioriteiten, incl. timing terugkoppeling aan TK	22/2	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op voortgangsrapportage en begeleidende tekst voor TK (samen met ADR rapport) over onderzoek naar benadeling in MSNP beschikking door vermelding OGS of FSV	1/3	Ja (5/3 - afhankelijk van ADR rapport)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord op voorstellen t.a.v. over doelgroep ('getipten', EOS), inhoud (vermelding MSNP) en verzendingswijze voor brief aangaande vermelding in FSV (motie Marijnissen)	3/3	Nee
4B. Opschalen capaciteit voor verwerking inzageverzoeken	Akkoord op voorstellen capaciteitsopschaling voor inzageverzoeken gegeven scenario-inschatting van risico's voor voldoen aan wettelijke termijn	3/3	Nee
7. Fraudeaanpak	Akkoord op contourennota Fraudeaanpak en begeleidende TK brief	N.t.b.	N.t.b.
6. Opstellen beslisnotitie Selectie aan de Poort - Project 1043	Akkoord op wel/niet weer in werking zetten proces selectie aan de poort en gebruik van AKI 1043 in zijn geheel, o.b.v. uitkomsten van de ADR audit naar opzet en bestaan van (nieuwe) waarborgen om een correcte toepassing te verzekeren.	12/3	Nee
1A. Veegactie nationaliteit, medische en straf. gegevens	Akkoord op definitief rapport veegactie nationaliteit en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
1B. 1B Analyse uitkomsten veegactie FSV-lijsten	Akkoord op definitief rapport veegactie persoonlijke omgevingen en begeleidende tekst voor TK brief	29/3	Ja (13/4)
2. Inzicht in gebruik FSV-signalen bij convenantpartners	Akkoord op voortgangsrapportage gebruik informatie uit FSV bij convenantpartners	6/4	Ja (13/4)
3. Inrichting tijdelijke nieuwe voorziening (TSV)	Akkoord op opleveringsmemo signaleringsvoorziening (TSV) en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
4A. Informeren van burgers & bedrijven over vermelding FSV	Akkoord eindrapportage verzending brief FSV vermelding en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
5. Identificatie van benadeling door OG/S & FSV vermelding bij MSNP	Akkoord op tweede voortgangsrapportage OG/S & FSV vermelding bij MSNP en begeleidende tekst voor TK brief	6/4	Ja (13/4)
Algemeen	Akkoord op TK brief t.a.v. algehele voortgang HVB programma	6/4	Ja (13/4)



Belastingdienst
